

L'étanchéité des conduits a été réalisée pour :

Saint-Constant, QC J5A0J6

Identification de l'étui Aeroseal : 7754

Matériel: HomeSeal Advance

Nom du technicien: Valentin Lamoulie

Date: 8/12/2026

Superficie en pieds carrés de la résidence: 900.0 ft²

Capacité du ventilateur: 1200.0 CFM


Description du système: fournaise électrique

Description des injections Plenum Injection

Zone desservie par l'appareil de traitement de l'air: 900.0 ft²


Type de conduit: Supply

Fuite (CFM@25Pa)

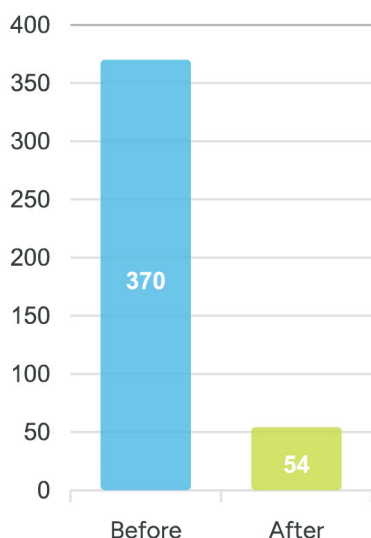

Fuite (CFM/100ft²@25Pa)

900.00 ft² de la surface de plancher climatisée

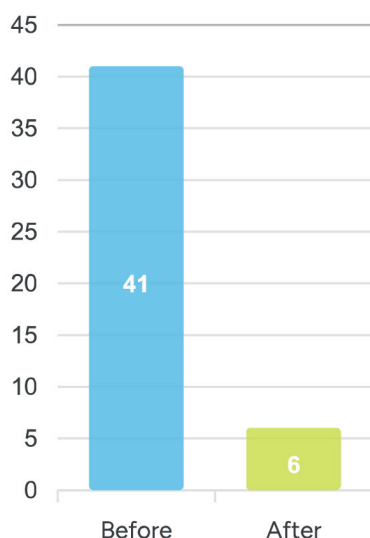

Les résultats de l'étanchéité des conduits sont calculés en CFM à une PRESSION DE SERVICE NORMALE de 25 Pa.

Fuite initiale équivalente à
69.9 Sq.In

Fuite finale équivalente à
10.2 Sq.In

Fuite finale à 25 Pa
6.0 CFM/100ft²@25Pa

Fuite en % de la capacité du système

30.8 %

Avant

4.5 %

Après



Équivalent à la
plantation de 50
arbres

Au-delà de tout autre service de réduction de la consommation d'énergie



Qualité air améliorée



Efficacité améliorée



Confort accru dans la maison

Scannez pour plus de détails

Aeroseal
aeroseal.com
877-FIX-DUCT
info@aeroseal.com



Etanchéité des conduits réalisée par :

Duraclim
7735 boulevard Saint Laurent
Montreal, QC H2R1X1
Téléphone: (514) 661 2242
